



COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CURSO: [SI727 Gerencia de Proyectos de Computación](#)

ENUNCIADO TRABAJO FINAL

PROFESOR:	ALAN TITO GUTIERREZ GUTIERREZ IVAN CHRISTIAN BAUTISTA FUENTES MONICA ROSARIO PRIALE DE LA PEÑA
SECCIÓN:	TODAS
FECHA DE EVALUACIÓN:	SEMANA 15
CICLO ACADEMICO:	2025-01

Objetivo:

El presente documento define el trabajo final y la rúbrica que permite evaluar el logro del curso [SI727 Gerencia de Proyectos de Computación](#)

Logro del curso:

Al finalizar el curso, el estudiante define un proyecto de desarrollo de software a través de la formulación, planificación, ejecución, control y cierre, garantizando la calidad y el cumplimiento del alcance, tiempo y costo.

En Ingeniería de Software, el logro contribuye a alcanzar el:

ABET – EAC - Student Outcome 3: Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias.

Informe de Proyecto del Curso

Respetar la estructura de contenido indicada a continuación.

Carátula

Universidad, carrera, ciclo

Nombre del curso
Sección
Nombre del profesor
"Informe de Trabajo "
Nombre del proyecto
Relación de integrantes
Mes y año

Registro de Versiones del Informe

Resumen Ejecutivo

Contenido

Tabla de contenidos

Student Outcome

Criterio Específico	Acciones realizadas	Conclusiones
3.c1. Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia		
3.c2. Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia		

- 1. Capítulo 1: Presentación del Proyecto**
1.1 Introducción que incluya el contenido del trabajo integral.
- 2. Capítulo 2: Marco Teórico**
- 3. Capítulo 3: Project Charter**
3.2 Planteamiento del problema

Problema	Causas
	•
	•

- 3.3 Objetivos**
 - 3.3.1** Objetivo General
 - 3.3.2** Objetivos Específicos
- 3.4** Indicadores de éxito
- 3.5** Alcance del proyecto
- 3.6** Restricciones

Restricciones	Descripción
Restricción 1	

3.7 Impacto en la organización

3.8 Organización del proyecto

3.8.1 Equipo del proyecto

El organigrama del proyecto es:

El equipo del proyecto estará conformado por:

Rol	Miembro	Responsabilidades

3.9 Stakeholders


Stakeholders	Necesidades	Entregables

--	--	--	--	--

4. Capítulo 4: Línea Base del Alcance

4.1 Matriz de Trazabilidad

4.2 Estructura de desglose de trabajo

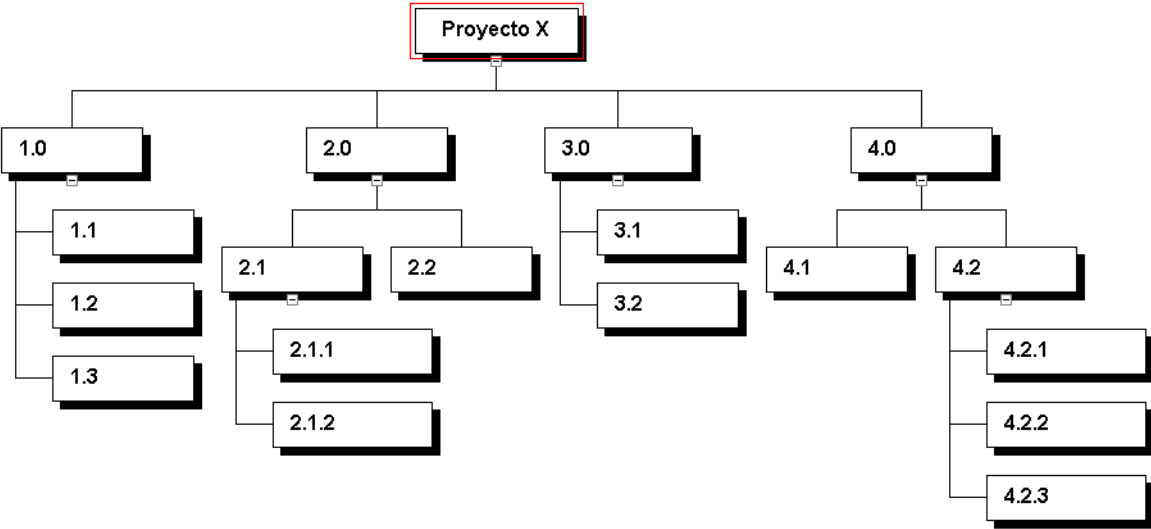

5. Capítulo 5: Línea Base de Costos

5.1 Costos por paquete de trabajo (Esquema nivel 3)

Ejemplo:

EDT	Nombre de tarea	Nombres de los recursos	Costo	Costo real	Costo restante	% completado	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin
0	COSTOS	PRESUPUESTO COSTO; TRAB	\$/31,545.00	\$/15,945.00	\$/15,600.00	38%	1512 horas	236 horas	lun 14/09/20	jue 3/06/21
1	PROYECTO DE SOFTWARE		\$/31,545.00	\$/15,945.00	\$/15,600.00	38%	1512 horas	236 horas	lun 14/09/20	jue 3/06/21
1.1	GESTIÓN DE PROYECTO		\$/19,545.00	\$/15,145.00	\$/4,400.00	85%	1416 horas	116 horas	lun 14/09/20	mar 18/05/21
1.1.1	GESTIÓN DEL ALCANCE	MAYRA; KARLA	\$/1,440.00	\$/1,440.00	\$/0.00	100%	8 horas	16 horas	lun 14/09/20	lun 14/09/20
1.1.2	PLANIFICACIÓN	MAYRA	\$/800.00	\$/400.00	\$/400.00	50%	8 horas	8 horas	mar 11/05/21	mar 11/05/21
1.1.3	RIESGOS	MAYRA	\$/800.00	\$/160.00	\$/640.00	20%	8 horas	8 horas	mié 12/05/21	mié 12/05/21
1.1.4	RECURSOS HUMANOS	MAYRA	\$/4,320.00	\$/960.00	\$/3,360.00	95%	40 horas	84 horas	mié 12/05/21	mar 18/05/21
1.1.5	ADQUISICIONES		\$/12,185.00	\$/12,185.00	\$/0.00	100%	6 horas	0 horas	mié 12/05/21	mié 12/05/21
1.2	GESTIÓN DE OPERACIÓN		\$/12,000.00	\$/800.00	\$/11,200.00	7%	72 horas	120 horas	sáb 22/05/21	jue 3/06/21
1.2.1	ANÁLISIS		\$/2,400.00	\$/800.00	\$/1,600.00	33%	24 horas	24 horas	sáb 22/05/21	mié 26/05/21
1.2.2	DISEÑO		\$/2,400.00	\$/0.00	\$/2,400.00	0%	24 horas	24 horas	jue 27/05/21	lun 31/05/21
1.2.3	DESARROLLO		\$/7,200.00	\$/0.00	\$/7,200.00	0%	24 horas	72 horas	mar 1/06/21	jue 3/06/21

5.2 Costos por tarea

Ejemplo:

EDT	Nombre de tarea	Nombres de los recursos	Costo	Costo real	Costo restante	% completado	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin
0	▲ COSTOS	PRESUPUESTO COSTO; TRAB	\$/31,545.00	\$/15,945.00	\$/15,600.00	38%	1512 horas	236 horas	lun 14/09/20	jue 3/06/21
1	▲ PROYECTO DE SOFTWARE		\$/31,545.00	\$/15,945.00	\$/15,600.00	38%	1512 horas	236 horas	lun 14/09/20	jue 3/06/21
1.1	▲ GESTIÓN DE PROYECTO		\$/19,545.00	\$/15,145.00	\$/4,400.00	85%	1416 horas	116 horas	lun 14/09/20	mar 18/05/21
1.1.1	GESTIÓN DEL ALCANCE	MAYRA; KARLA	\$/1,440.00	\$/1,440.00	\$/0.00	100%	8 horas	16 horas	lun 14/09/20	lun 14/09/20
1.1.2	PLANIFICACIÓN	MAYRA	\$/800.00	\$/400.00	\$/400.00	50%	8 horas	8 horas	mar 11/05/21	mar 11/05/21
1.1.3	RIESGOS	MAYRA	\$/800.00	\$/160.00	\$/640.00	20%	8 horas	8 horas	mié 12/05/21	mié 12/05/21
1.1.4	▲ RECURSOS HUMANOS	MAYRA	\$/4,320.00	\$/960.00	\$/3,360.00	95%	40 horas	84 horas	mié 12/05/21	mar 18/05/21
1.1.4.1	Contratación de personal	ROSITA	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	100%	40 horas	40 horas	mié 12/05/21	mar 18/05/21
1.1.4.2	Inducción de personal	KARLA	\$/320.00	\$/160.00	\$/160.00	50%	4 horas	4 horas	mié 12/05/21	mié 12/05/21
1.1.5	▲ ADQUISICIONES		\$/12,185.00	\$/12,185.00	\$/0.00	100%	6 horas	0 horas	mié 12/05/21	mié 12/05/21
1.1.5.1	▲ COMPRA DE MATERIALES		\$/9,085.00	\$/9,085.00	\$/0.00	100%	2 horas	0 horas	mié 12/05/21	mié 12/05/21
1.1.5.1.1	COMPRAS DE COMPUTADORAS	COMPUTADORAS[2]	\$/2,000.00	\$/2,000.00	\$/0.00	100%	2 horas	0 horas	mié 12/05/21	mié 12/05/21

5.3 Reservas para contingencias (Riesgos conocidos)

5.3.1 Proyección de costos

#	Código EDT	Riesgo	Costo Actividad	Probabilidad (Horas/días)	Impacto (Costo)	Cantidad	Costo Reservas	Reserva (%) (Costo Reserva/Costo Actividad)
TOTAL								

5.3.2 Proyección de costos en project

Ejemplo:

Modo de	Nombre de tarea	Costo presupuestado	Trabajo presupuestado	Detalles	T3	T4	2021 T1	T2	T3
	COSTOS	S/21,124.34	4,000 horas	Costo	S/1,440.00			S/30,105.00	
				Costo presupuestado	S/2,500.00	S/6,984.13	S/6,772.49	S/4,867.72	
				Trabajo presupuestado	275.13h	1,396.83h	1,354.5h	973.54h	
	PRESUPUESTO COSTO	S/21,124.34		Costo					
				Costo presupuestado	S/2,500.00	S/6,984.13	S/6,772.49	S/4,867.72	
				Trabajo presupuestado					
	TRABAJO PRESUPUESTADO		4,000 horas	Costo					
				Costo presupuestado					
				Trabajo presupuestado	275.13h	1,396.83h	1,354.5h	973.54h	

5.4 Reservas para contingencias (Riesgos desconocidos)

Precisar porcentaje y costo que la organización está definiendo para los riesgos desconocidos

En el Project agregar recurso PRESUPUESTO COSTO2 (entre 10%-25%) para incorporar este costo y pegar la pantalla y adjuntar en Anexo 2 el archivo de Microsoft Project.

5.5 Línea base de costo por uso de tareas

Ejemplo:

EDT	Nombre de tarea	Costo	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Detalles	Semestre 2, 2020				
								J	A	S	O	N
	AGUA	S/12,000.00			mié 1/07/20	mié 30/06/21	Costo	S/1,045.45	S/954.55	S/1,000.00	S/3,000.00	S/0.00
							Trab. real					
	LUIS	S/1,600.00	8 horas		mié 1/07/20	mié 1/07/20	Costo	S/1,600.00				
							Trab. real					
1.1.5.2.4	HOSTING	S/13,600.00	8 horas	8 horas	mié 1/07/20	mié 30/06/21	Costo	S/2,645.45	S/954.55	S/1,000.00	S/3,000.00	S/0.00
							Trab. real					
	HOSTING	S/12,000.00			mié 1/07/20	mié 30/06/21	Costo	S/1,045.45	S/954.55	S/1,000.00	S/3,000.00	S/0.00
							Trab. real					
	VICTOR	S/2,600.00	8 horas		mié 1/07/20	mié 1/07/20	Costo	S/1,600.00				
							Trab. real					
1.1.5.2.5	LIMPIEZA	S/12,800.00	8 horas	8 horas	mié 1/07/20	mié 30/06/21	Costo	S/1,845.45	S/954.55	S/1,000.00	S/1,000.00	S/954.55
							Trab. real					
	ROSA	S/800.00	8 horas		mié 1/07/20	mié 1/07/20	Costo	S/800.00				
							Trab. real					
	LIMPIEZA	S/12,000.00			mié 1/07/20	mié 30/06/21	Costo	S/1,045.45	S/954.55	S/1,000.00	S/1,000.00	S/954.55
							Trab. real					
1.1.5.2.6	SEGURIDAD	S/18,800.00	8 horas	8 horas	mié 1/07/20	mié 30/06/21	Costo	S/2,368.18	S/1,431.82	S/1,500.00	S/1,500.00	S/1,431.82
							Trab. real					
	DANIEL	S/800.00	8 horas		mié 1/07/20	mié 1/07/20	Costo	S/800.00				
							Trab. real					
	VIGILANCIA	S/18,000.00			mié 1/07/20	mié 30/06/21	Costo	S/1,568.18	S/1,431.82	S/1,500.00	S/1,500.00	S/1,431.82
							Trab. real					
1.2	GESTIÓN DE OPERACIÓN	S/12,000.00	120 horas	72 horas	sáb 22/05/21	jue 3/06/21	Costo					
							Trab. real					

6. Capítulo 6: Gestión de Recursos

6.1 Matriz de Roles y responsabilidades

Ejemplo de matriz tipo RACI. El grupo deberá elegir qué tipo de matriz utilizar, justificar por qué y desarrollarla.

#	Código EDT	Tipo de recurso requerido (RBS)	Cantidad	¿Involucra adquisición de personal?	¿Involucra adquisiciones?	Costo por hora Trabajo	Costo unitario (otras adquisiciones)	Costo Total
		Jefe de proyecto	1	si	no	20*160	-	3,200

6.3 Visión General de los recursos


Ejemplo:



7. Capítulo 7: Gestión de Riesgos

7.1 Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

Ejemplo:

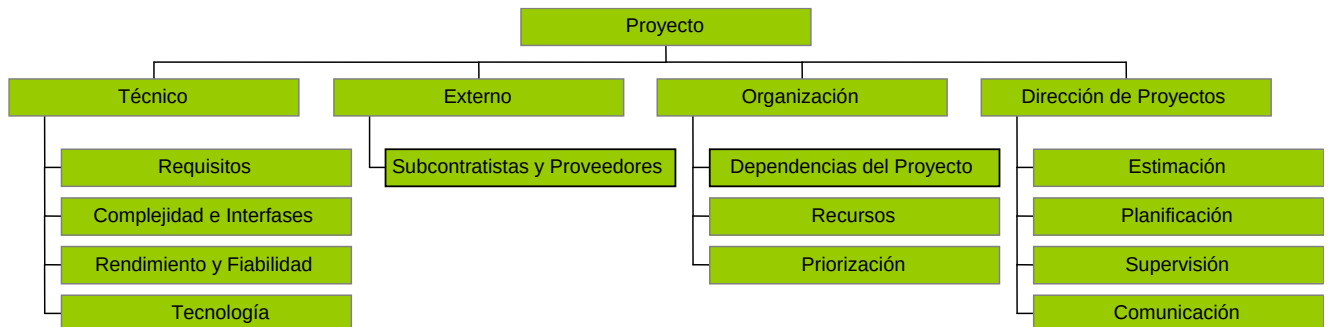

7.2 Definición de Escalas de Impacto

Ejemplo:

Condiciones definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto					
Objetivos del Proyecto	Muy Bajo (0.1)	Bajo (0.2)	Moderado (0.4)	Alto (0.6)	Muy Alto (0.8)
Costo: El presupuesto no exceda el presupuesto asignado	Aumento del presupuesto < 3 %	Aumento del presupuesto < 8 %	Aumento del presupuesto entre 8 - 15 %	Aumento del presupuesto entre 16 - 25 %	Aumento del presupuesto > 25 %
Tiempo: El plazo para la implantación del proyecto no debe pasar de Octubre del 2006	Retraso de la implantación < 3 días	Retraso de la implantación < 5 días	Retraso de la implantación entre 6 a 10 días	Retraso de la implantación entre 11 a 15 días	Retraso de la implantación > 15 días
Alcance: Cambios en el Alcance Inicial del Proyecto, ya sea por decisión del Negocio o del Organismo Regulador	Cambios mínimos que no afectan ni al presupuesto ni al cronograma	Cambios que afectan al presupuesto y/o al cronograma en < 3 %	Cambios que afectan al presupuesto y/o al cronograma entre 4 - 7 %	Cambios que afectan al presupuesto y/o al cronograma entre 8 - 10 %	Cambios que afectan al presupuesto y/o al cronograma en > 10 %
Calidad: Deben haber pocas incidencias y un buen tiempo de respuesta en las aplicaciones	Número de Incidencias en los aplicativos < 5 y/o tiempos de respuesta de 3 segundos por transacción	Incidencias en los aplicativos entre 6 a 12 y/o tiempos de respuesta de 5 segundos por transacción	Incidencias en los aplicativos entre 13 a 20 y/o tiempos de respuesta de 7 segundos por transacción	Incidencias en los aplicativos entre 21 a 30 y/o tiempos de respuesta de 9 segundos por transacción	Incidencias en los aplicativos > 30 y/o tiempos de respuesta de más de 10 segundos por transacción

7.3 Matriz de Probabilidad e Impacto

Ejemplo:

Prob.	Amenazas					Oportunidades				
0.9	0.045	0.09	0.18	0.36	0.72	0.72	0.36	0.18	0.09	0.045
0.7	0.035	0.07	0.14	0.28	0.56	0.56	0.28	0.14	0.07	0.035
0.5	0.025	0.05	0.10	0.20	0.40	0.40	0.20	0.10	0.05	0.025
0.3	0.015	0.03	0.06	0.12	0.24	0.24	0.12	0.06	0.03	0.015
0.1	0.005	0.01	0.02	0.04	0.08	0.08	0.04	0.02	0.01	0.005
	0.05	0.1	0.2	0.4	0.8	0.8	0.4	0.2	0.1	0.05

7.4 Registro de Riesgos

Se deben identificar mínimo 20 riesgos

#	Código EDT	Riesgo identificado	Causas de los Riesgos	Impacto del Riesgo	Posibles Respuestas	Identificado por:

7.5 Registro de Riesgos (priorizados)

#	Código EDT	Riesgo identificado	Categoría del riesgo (RBS)	Probabilidad	Impacto	Probabilidad X Impacto	¿Requiere respuesta inmediata!	Nivel del riesgo
							<Especificar planes de acción y responsables de los riesgos>	<Alto, medio o bajo e identificar el color rojo, amarillo o verde según matriz de probabilidad e impacto>

7.6 Respuesta a los riesgos (Estrategias y respuesta)

#	Riesgo identificado	Dueños de los riesgos	Estrategias de Respuesta	Síntomas y señales de advertencia	Presupuesto y reservas de contingencia	Planes de contingencia y de respaldo	Posibles riesgos residuales y secundarios
			<Mitigar, transferir, eliminar (A) y explotar, mejorar, compartir (O) y aceptar>		<\$ para implementar las estrategias y para contingencias>	<Planes de contingencia si es que el riesgo fue aceptado y planes de reserva para los otros riesgos si es que el plan principal falla>	

8. Capítulo 8: Gestión de la Calidad

8.1 Métricas de Calidad

#	Qué queremos medir	Objetivo de Proyecto	Métrica	Fuente de datos	Proceso
	Desviación de plazos de proyectos	Objetivo de cumplimiento del tiempo asignado al proyecto	SPI Índice del desempeño del cronograma	Cronograma	Control del Cronograma

9. **Capítulo 9: Gestión de Comunicaciones**
9.1 Matriz de comunicaciones

Interesados principales	Información que será comunicada (Entregables de comunicación)	Responsables de distribuir la información	Método de Comunicación a ser utilizado (Memorando, correo electrónico, actas, etc.)	Frecuencia de comunicación (mensual, semanal, quincenal)
Patrocinador	Reporte de Hitos (formal-escrito)	Gerente de Proyecto	Correo electrónico	quincenal

10. **Capítulo 10: Gestión de Interesados**
10.1 Evaluación de la información de los interesados

Nro.	Interesado	Tipo de Interesado	Principales Necesidades e Intereses	Principales Requerimientos	Influencia en el Proyecto

* Tipo de Interesado (Cliente, Patrocinador, Directores, Usuario, etc)

* Influencia en el proyecto (alto, medio, bajo)

10.1 Matriz de Análisis de los interesados

Nro.	Interesado	Nivel de Participación	Clasificación	Evaluación del impacto de no cumplir con sus requerimientos	Estrategia potencial para conseguir su apoyo en el proyecto

* Clasificación (opositor, neutral, partidario, etc)

* Nivel de Participación (alto, medio, bajo)

11. Capítulo 11: User Story Mapping

11.1 User Story Mapping

- Desarrollar el User Story Mapping para el producto software a desarrollar, identificar los reléase y primer MVP. Definir el flujo representativo que experimentará el usuario empezando por las actividades más relevantes para las cuales será usada la solución. A estas actividades las llamaremos Épicas. Adicionamos tareas de usuario bajo cada actividad en el flujo de trabajo, de izquierda a derecha. A esto lo llamaremos Features.

12. Capítulo 12: Marco de agilidad

12.1 Aplicación de Scrum

- Priorizar el product backlog en base a la técnica de MoSCoW.

- En base al primer sprint el equipo determinar la estimación conjunta del esfuerzo en base a puntos de historia, se debe justificar las tareas. Considerar el siguiente ejemplo:

N°	Historias de usuario	Justificación	Puntos de Historia
HU001	Como médico quiero acceder a las historias clínicas, para la atención del paciente y poder colocar las indicaciones de la atención.	- Generación de acceso a la base de datos para extraer la información. - Generación de reporte - Adicionar diagnóstico por cita	5
HU002	H02 - Como usuario, quiero acceder a citas en línea para que la sesión quede grabada y pueda acceder a las indicaciones del médico en las ocasiones que sean necesarias.	- Acceso por rol a la sala de cita médica (médico y usuario). - Generación de sesión virtual. - Generación de interfaces de sesión de citas. - Opción de grabación de la plataforma.	8
Total Puntos de Historia			13

- Determinar políticas DoD y DoR.(5 ítems por cada tipo).
- De acuerdo al Sprint 1, por cada historia de usuario desarrollar sus criterios de aceptación (mínimo 2 por cada HU). Considerar el siguiente ejemplo:

Épica:	Implementación de módulo de atención médica en línea		
ID-HU	01	Owner	JPineda
Título HU	Acceso a historias clínicas		
Puntos de Estimación	5	Sprint	1
Descripción HU Como médico quiero acceder a las historias clínicas, para la atención del paciente y poder colocar las indicaciones de la atención.			
Criterios de Aceptación: - Escenario 01: Acceso a la historia clínica Dado que el médico requiere acceder a la historia clínica Cuando se genere una cita en línea Entonces el sistema habilitará la opción de historia clínica del paciente. - Escenario 02: Registro de diagnóstico en la historia clínica Dado que el médico requiere registrar el diagnóstico del paciente Cuando se genere una cita en línea			

Entonces el sistema habilitará la opción “Nuevo registro”
Y mostrará la nueva pantalla de registro de información
Y el médico luego de registrar el diagnóstico podrá dar click en el botón grabar
Y la información quedará registrada en el sistema

- Desarrollar el burndown chart del primer sprint
- Definir la Velocidad del Equipo.

13. Capítulo 13: OKR

- Definir al menos 2 objetivos de su compañía o emprendimiento y 2 kr's por cada objetivo.

N°	Objetivo Empresa	Resultado clave empresa	
Objetivo:	Descripción objetivo Empresa	Líder:	Responsable OKR
	Resultado Clave (KR)	Iniciativas Claves	KR (Impactado)
1.			1 2 3 4
			X
			X X
2.			X X
			X X
			X
Equipo de Trabajo: Indicar las personas ó roles que conforman el equipo		Dependencias/Stakeholders/Recursos/Consideraciones Dependencia con algún proyecto / actividad	

Definir como mínimo 3 iniciativas por cada resultado Clave

14. Capítulo 14 Transferencia de proyecto

Definir el proceso de transferencia de proyecto considerando roles, actividades, forma de envío de entregables y el software. El proceso de transferencia definido debe ser presentado como un flujograma u organizador gráfico en el que se muestren claramente los roles y actividades involucrados, así como los activos del software (documentos, código fuente, ejecutables, entre otros que consideren necesarios).

Determine una planificación para esta transferencia, basada en el proceso presentado en el punto anterior, y plásmela en un archivo MS Project.

Determine el costo de la transferencia haciendo uso de las opciones de costeo del MS Project sobre la planificación realizada.

15. Capítulo 15: Cierre de Proyecto

14.1 Datos del Proyecto

Precisar datos de Inicio y Fin de proyecto (INCLUYE LA GARANTIA)

Ejemplo: 1/7/21 – 31/12/21 PROYECTO + GARANTÍA

Precisar si respecto a lo planificado ha habido variación de plazos.

14.2 Entregables del Proyecto

14.2.1 Entregables Operativos (CICLO DE VIDA)

Considerar el siguiente ejemplo:

Entregable	Estado
Manuales	Aprobado
Aplicación Móvil	
Aplicación Web	
Historias de Usuario (Refinamientos de historia)	

14.2.2 Entregables de Gestión

Considerar el siguiente ejemplo:

Entregable	Estado
Acta de constitución del proyecto	Aprobado
Plan de recursos humanos	

14.3 Activos del Proyecto

Definir activos físicos, servicios y recursos del proyecto.

14.3.1 Activos Físicos

Considerar el siguiente ejemplo:

Activo	Acción	Fecha
Laptop	Venta	
Servidor	Traslado a otro proyecto	

14.3.2 Servicios

Considerar el siguiente ejemplo:

SERVICIO	Acción	Fecha
Agua	Cancelación de contrato al mes de diciembre	
Internet		

14.3.3 Recursos

Considerar el siguiente ejemplo:

ROL	Acción	Fecha
PROGRAMADOR	Cancelación de contrato	
PRODUCT OWNER	Traslado a otro proyecto	

14.4 Costos

- Costos comprometidos a inicio del proyecto:
Presentar costos comprometidos al inicio del proyecto, incluyendo la contingencia
- Costos incurridos al final del proyecto:
Presentar costos ejecutados al final del proyecto, precisar si se ha ejecutado la contingencia. Se debe justificar la variación positiva o negativa del costo.

En base a la primera línea base desarrollar una gráfica de ejecución de costos planificados por mes versus la última línea base (real)

16. Lecciones Aprendidas

Desarrollar como mínimo 2 lecciones aprendidas por cada miembro del equipo

Nombre del proyecto:	Miembro del equipo:
Fase del proyecto:	Categoría:
Actividad que genera la lección aprendida:	
Acciones implementadas:	
Resultados obtenidos:	
Recomendaciones:	

17. Conclusiones

Considerar mínimo 3 conclusiones por cada miembro del equipo. Colocar el nombre de cada uno de los alumnos antes de cada conclusión.

El total de conclusiones deben hacer referencia a todas las áreas de proceso del PMBOK

18. Glosario

19. Bibliografía

Consideraciones sobre el desarrollo de los componentes

1. Enunciado

El trabajo consta de entender, aplicar y desarrollar el Plan de Dirección de Proyecto, según los lineamientos del PMBOK, marco de agilidad y gestión en un caso de estudio.

2. Exposición

La exposición forma parte de la nota. Si al momento de la exposición el profesor determina que el alumno no ha hecho parte o la totalidad del trabajo debido a que el alumno no supo responder correctamente a las preguntas realizadas el profesor podrá considerar descontar puntos en funcionalidades ya implementadas del trabajo. La frase “En esa parte me ayudaron” no será considerada como válida por lo que el alumno deberá realizar el trabajo de forma total.

La metodología para considerar en la evaluación será:

- El grupo deberá dosificar el tiempo de exposición según los integrantes del grupo.
- La ronda de preguntas y respuestas podrá durar hasta 10 minutos aproximadamente (pudiendo hacer preguntas por los demás grupos)

3. Instrucciones para la entrega del trabajo

- La calificación del trabajo es individual donde se medirá el rendimiento del alumno de acuerdo con la rúbrica que se entregará en clases.
- El plazo es impostergable y por ningún motivo y/o circunstancia se recibirá trabajos fuera de esa fecha y hora.
- El trabajo debe entregarse documentado en archivo digital durante la semana 7.
- Ensaye, con la debida anticipación, su presentación frente a sus compañeros de grupo, con cronometro en mano (recuerden que tienen un máximo de 30 minutos para que expongan todos los integrantes del grupo).
- El contenido del trabajo debe estar estructurado por áreas de conocimiento según el marco del PMBOK.

4. Registro de Versiones del Informe

El objetivo de esta sección es resumir las modificaciones relevantes que se realizan al informe durante el ciclo de vida del proyecto.

Esta sección inicia en una página nueva y se incluye un cuadro con la siguiente estructura:

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación

Como primera línea de la tabla se incluye la primera versión del informe. A partir de ello, se considera modificaciones relevantes la adición de secciones, eliminación de secciones, correcciones o mejoras producto de retroalimentación recibida del docente o producto de la autocrítica del equipo.

5. Contenido

La sección inicia en una nueva página. Para esta sección utilice el generador de tablas de contenido de Microsoft Word. Considere en la generación 4 niveles de esquema. Recuerde actualizar y verificar la tabla de contenidos antes de cada entrega.

6. Student Outcome

Cada participante del equipo debe colaborar a fin de que se redacte como grupo los sustentos y evidencias de las actividades realizadas en el trabajo final han ayudado a desarrollar cómo las dimensiones del student outcome. Por ello en esta sección debe quedar descrito por escrito, la relación entre el outcome, sus dimensiones y el trabajo que han realizado.

A manera de referencia se incluye los aspectos específicos que corresponden al **ABET – EAC - Student Outcome 3**: Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias.

Criterio Específico	Acciones realizadas	Conclusiones
3.c1. Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia		
3.c2. Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia		

7. Entregables a considerar (Todos deben ser remitidos por el aula virtual)

- Estructura del Informe del Plan de Proyecto
- Anexo 1: Matriz de Trazabilidad
- Anexo 2 Microsoft Project
- Presentación Power Point

Considerar que No se admitirán envíos de rutas para revisión de entregables, todos los archivos de los entregables deben estar cargados en el aula virtual.
