



Unidad 1 - Introducción a la Gerencia de Proyectos

Agenda



- Marco conceptual de la gerencia de Proyectos.
- Programa, Portafolio y PMO.
- Habilidades del Gerente de Proyectos y los miembros de equipo (Habilidades blandas).
- Procesos de la Gerencia de Proyectos en la versión 6.
- Introducción a la gestión de proyectos de software.



Marco conceptual de la gerencia de proyectos

¿Qué es un Proyecto?



- “Un Proyecto es un esfuerzo **temporal** que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”.
 - ✓ Un **producto** que puede ser parte de otro proyecto
 - ✓ Una **capacidad** para prestar un servicio
 - ✓ Un **documento**
 - ✓ Una **mejora** sobre algo ya existente.
- Temporal: Tiene un inicio y un fin.
- No es un proceso continuo.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=Og7il31kwPQ>

Ejemplos de Proyectos



Desarrollar un
Software



Construir una obra u
edificio



Reestructurar una
organización



Vender un Negocio



Crear un nuevo
producto o servicio



Implementar un
proceso de negocio

¿Qué es una Operación?



Es una función organizacional desarrollada siguiendo una secuencia de actividades que producen el mismo producto o proveen del mismo servicio de forma continuada.

Los proyectos y las operaciones tienen algunas **similitudes**:

- Realizadas por personas.
- Con limitación de recursos.
- Se planifican, se ejecutan y se controlan.

Operaciones vs Proyectos




Operaciones	Proyectos
Continuo	Fecha Inicio y Fin
Producto o Servicio estándar	Producto o Servicio único
Disciplina única	Equipos multi-disciplinarios
Mantiene “Status Quo”	Catalizador para la gestión de cambios

¿Qué es la Gerencia de Proyectos?



- Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer sus requisitos.
- Establecer objetivos claros y posibles de realizar
- Equilibrar las limitaciones o restricciones del proyecto: calidad, alcance, tiempo, costes, recursos y riesgos.

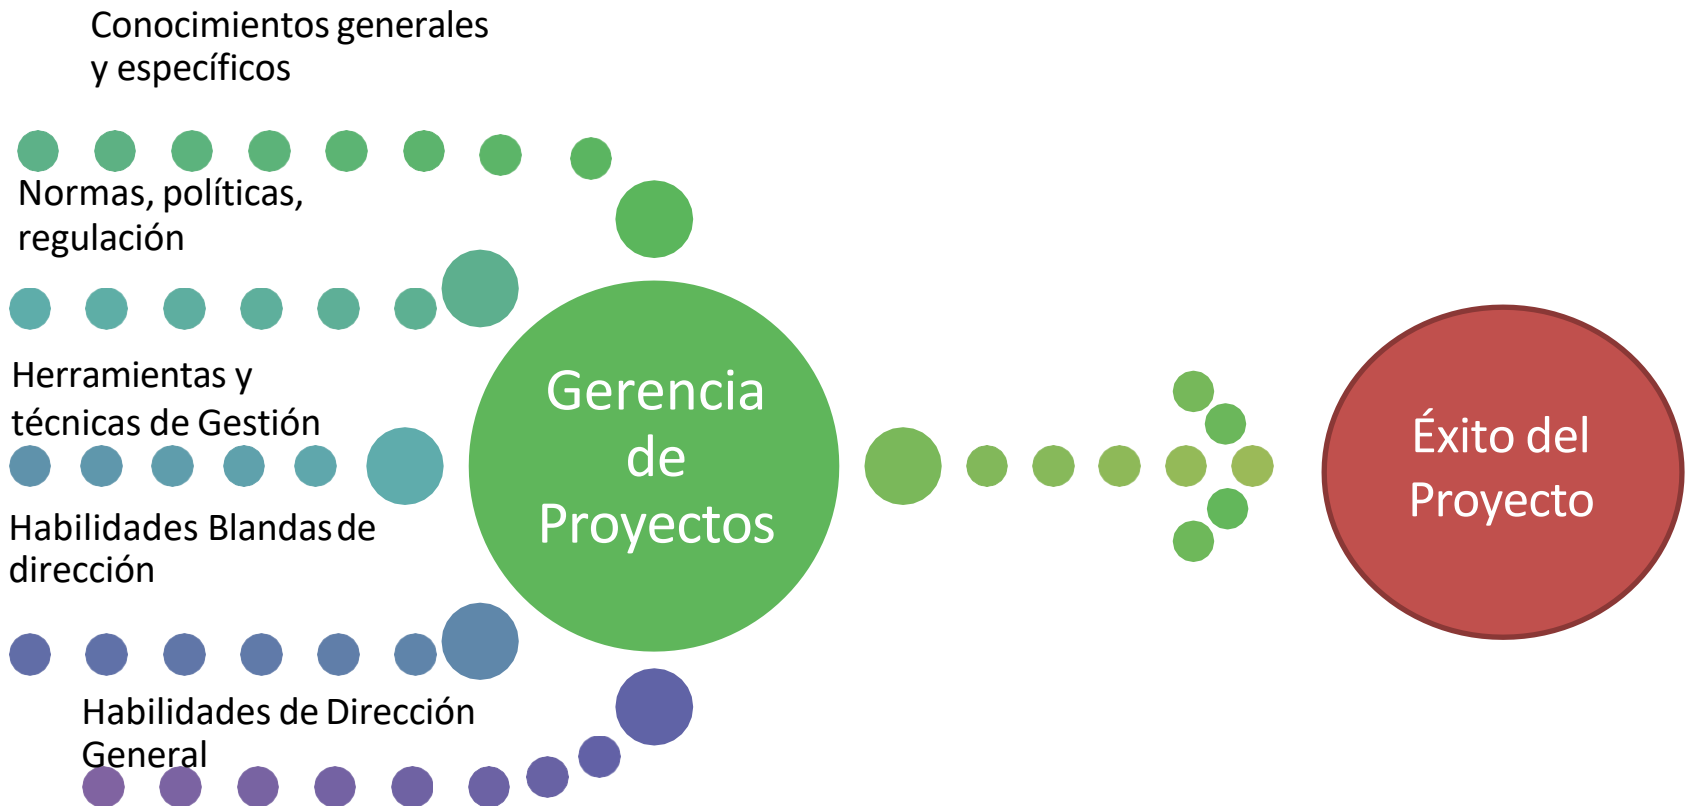

¿Project Failure?



https://youtu.be/xx8f4x6C_KY

Denver Baggage Handling System

http://calteam.com/WTPF/?page_id=2086



¿Por qué es importante?



Opera Sidney

- Presupuesto: 7 millones de dólares.
- Costo Final: 102 millones de dólares.



Metropolitano

- Presupuesto: 135 millones de dólares.
- Costo Final: 300 millones de dólares.

Cumplir con el PRESUPUESTO

¿Por qué es importante?



Tunel del canal de la Mancha

- Entrega estimada: 1992
- Entrega real: 1994



Costa Verde Para Todos – Tramo II

- Entrega estimada: Nov 2014.
- Entrega real: Mar 2015

Cumplir con el CRONOGRAMA

¿Por qué es importante?



Tacoma Narrows Bridge

- Presupuesto y fecha de Entrega OK 1940.



Nuevo Hospital del Niño

- Presupuesto OK y Fecha de Entrega OK (Julio 2011)
- Inicio en operaciones 2013.

Cumplir con el CALIDAD y ALCANCE

Fuente 1: <https://gestion.pe/economia/salvador-del-solar-ejecucion-de-obras-se-fortalecera-por-utilizacion-de-pmos-noticia/>

La Triple Restricción en un Proyecto



- Las principales restricciones de un proyecto son:
 - Tiempo
 - Costo
 - Alcance
- Deben balancearse para mantener el éxito del proyecto.
- Si una restricción varía, las otras también deben variar.
- Bajo estas restricciones se debe asegurar la Calidad, Satisfacción del cliente, Riesgos y Recursos.






Los Objetivos:

- **Se recogen** en el acta de constitución.
- El **proyecto** se considera **completo** cuando se han alcanzado.
- Una razón de **terminar** el proyecto **anticipadamente** es cuando se ve que los objetivos no se van a cumplir.
- Es **responsabilidad** del director del proyecto el conseguir que se cumplan.

Que es un Programa?




Es un grupo de **proyectos relacionados**, que pueden ser manejados en una forma coordinada para obtener beneficios y control que no se obtendría si se gestionaran de forma individual.

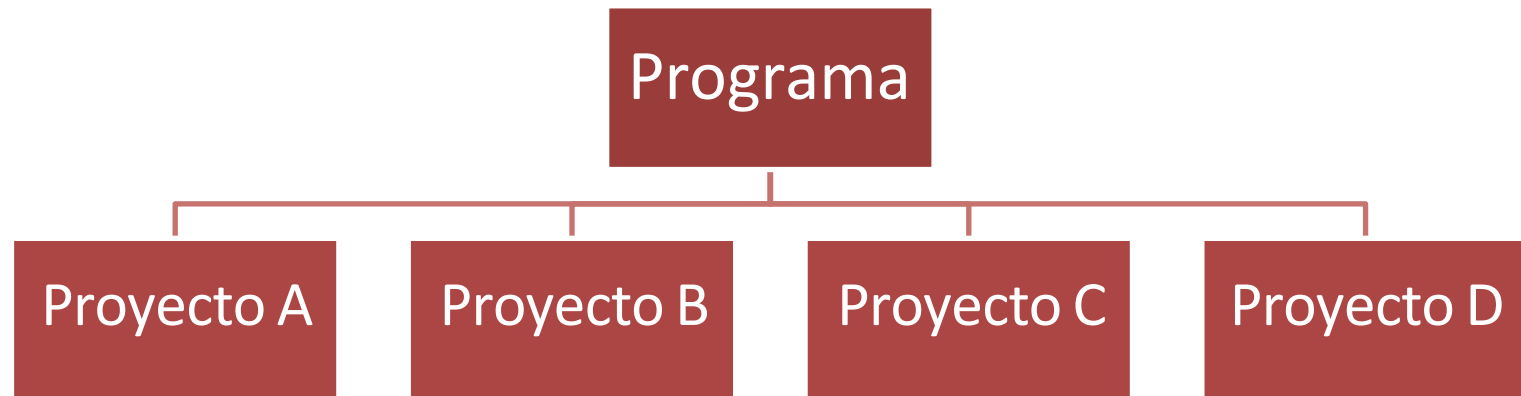


¿Qué es un Portafolio?



Grupo de proyectos, programas y otro trabajo relacionado, que se agrupa para facilitar su gestión y hacerla más efectiva con el fin de asegurar la consecución de los **objetivos estratégicos** del negocio.

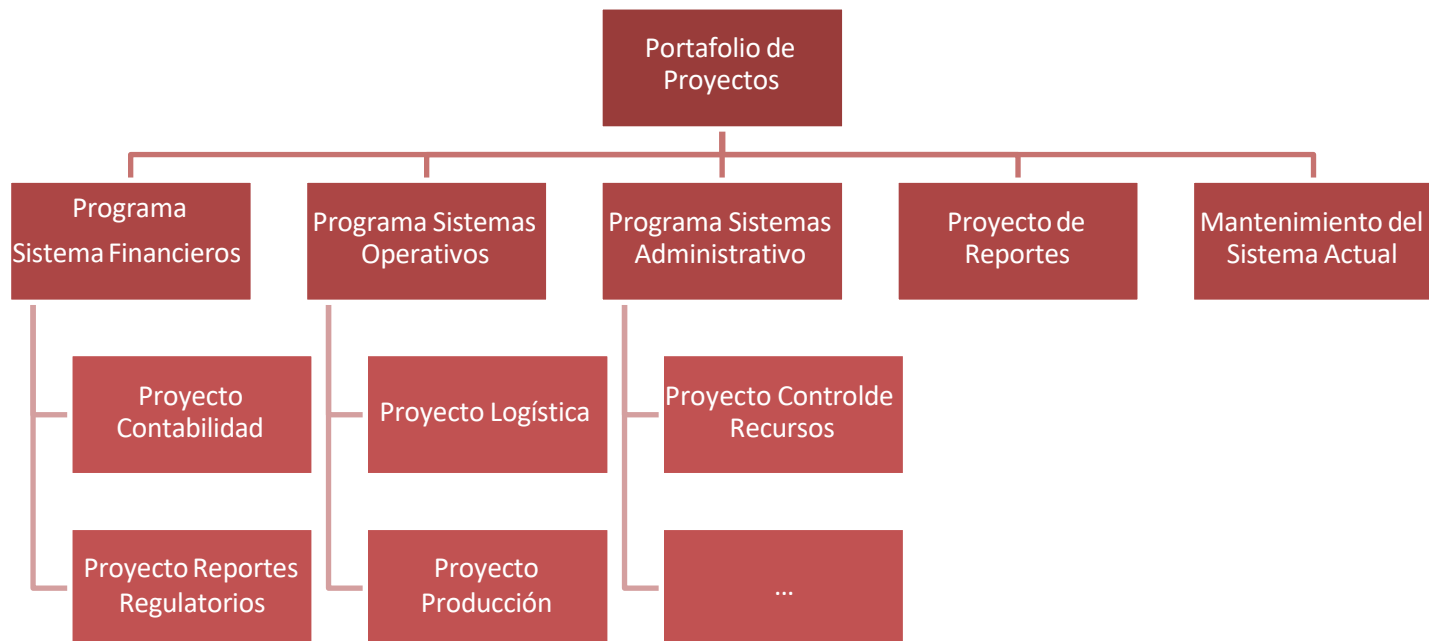

¿Como se alinean el Portafolio de Proyectos al Plan Estratégico?

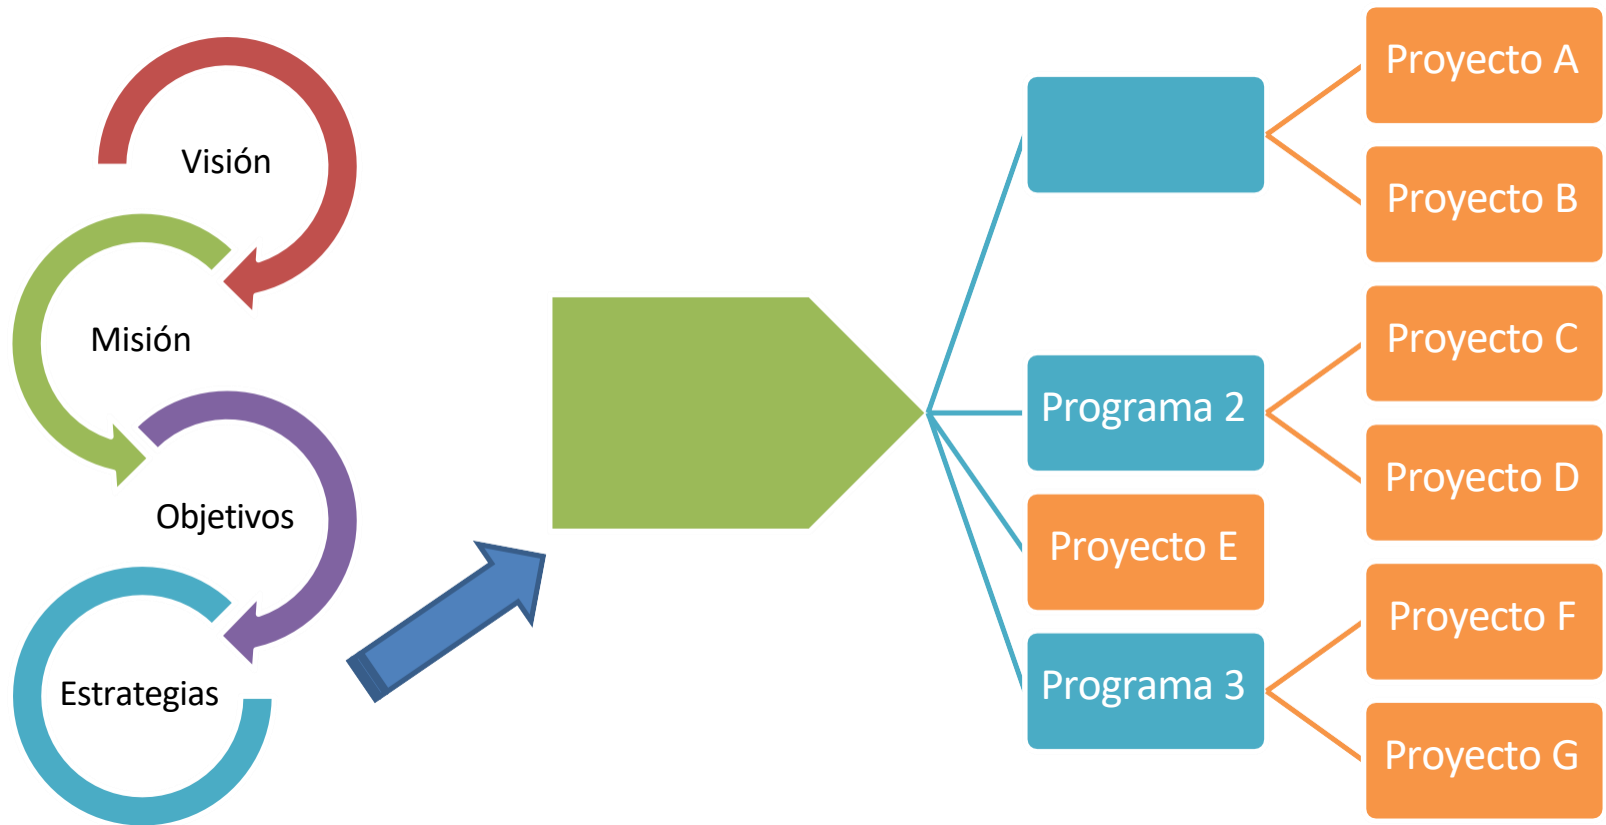

Project Management Office - PMO



Es la encargada de centralizar y coordinar la dirección de proyectos en una organización con el fin de asegurar que sean exitosos.





El Rol del Project Manager

El rol del Project Manager



Responsable de **satisfacer las necesidades** a nivel de: tareas, equipo e individuales.

Es el **enlace** entre la estrategia de la organización y el equipo de proyecto.

- Garantizar los Objetivos
- Reclutar y motivar al equipo.
- Construir estrategias y planes.
- Controlar la ejecución del proyecto.
- Detectar y resolver problemas y conflictos.
- Asegurar la calidad.
- Mitigar los riesgos.

[Video 1:](#) ¿Cuáles son las características esenciales en un Director de Proyectos?

<https://youtu.be/i35EJmzVBSk>

[Video 2:](#) Las 7 cualidades de un buen director de proyectos

<https://youtu.be/eCe26EwEebE>

Habilidades Blandas

Soft Skills



Comunicación



Liderazgo



Motivación



Negociación



Gestión de
Conflictos


Triángulo de Talentos del PMI





Procesos de la Gerencia de Proyectos

Proceso de Dirección de Proyectos

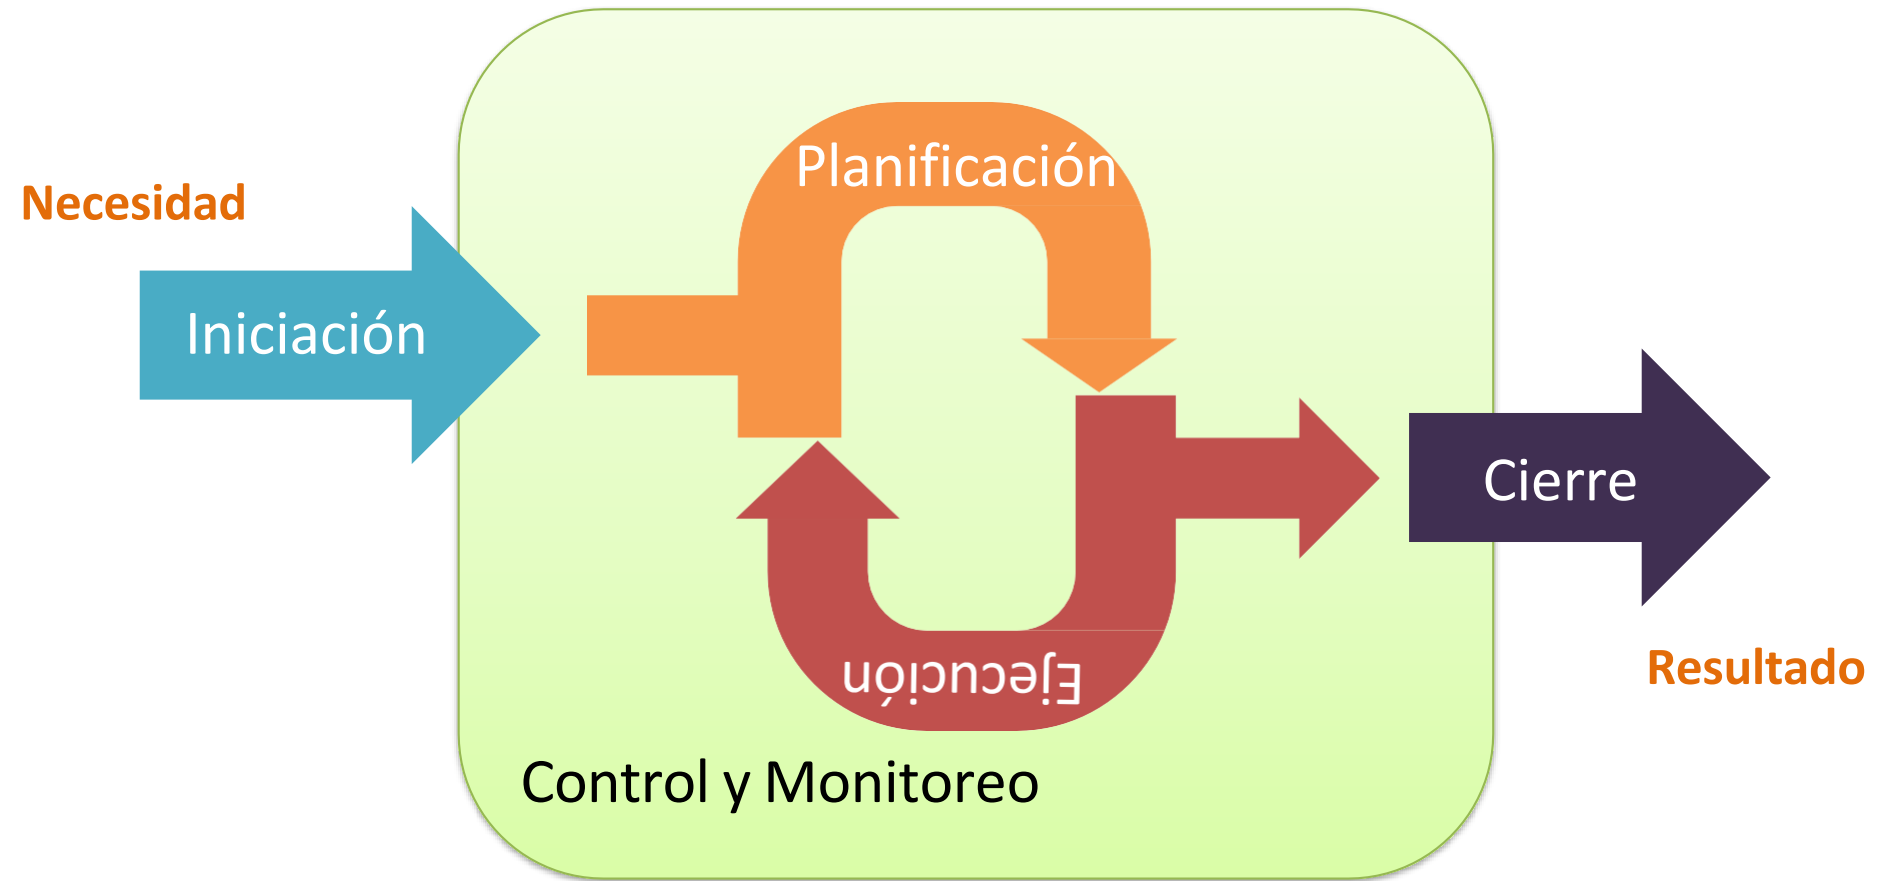

Áreas del Conocimiento

Pmbok v6



Integración



Alcance



Tiempo



Costo



Recursos



Riesgo



Calidad



Comunicación



Adquisiciones



Interesados




Ciclo de Vida del proyecto y Estructura de la Organización

Ciclo de Vida del Proyecto vs Ciclo de Vida del Producto



Relación entre ambos

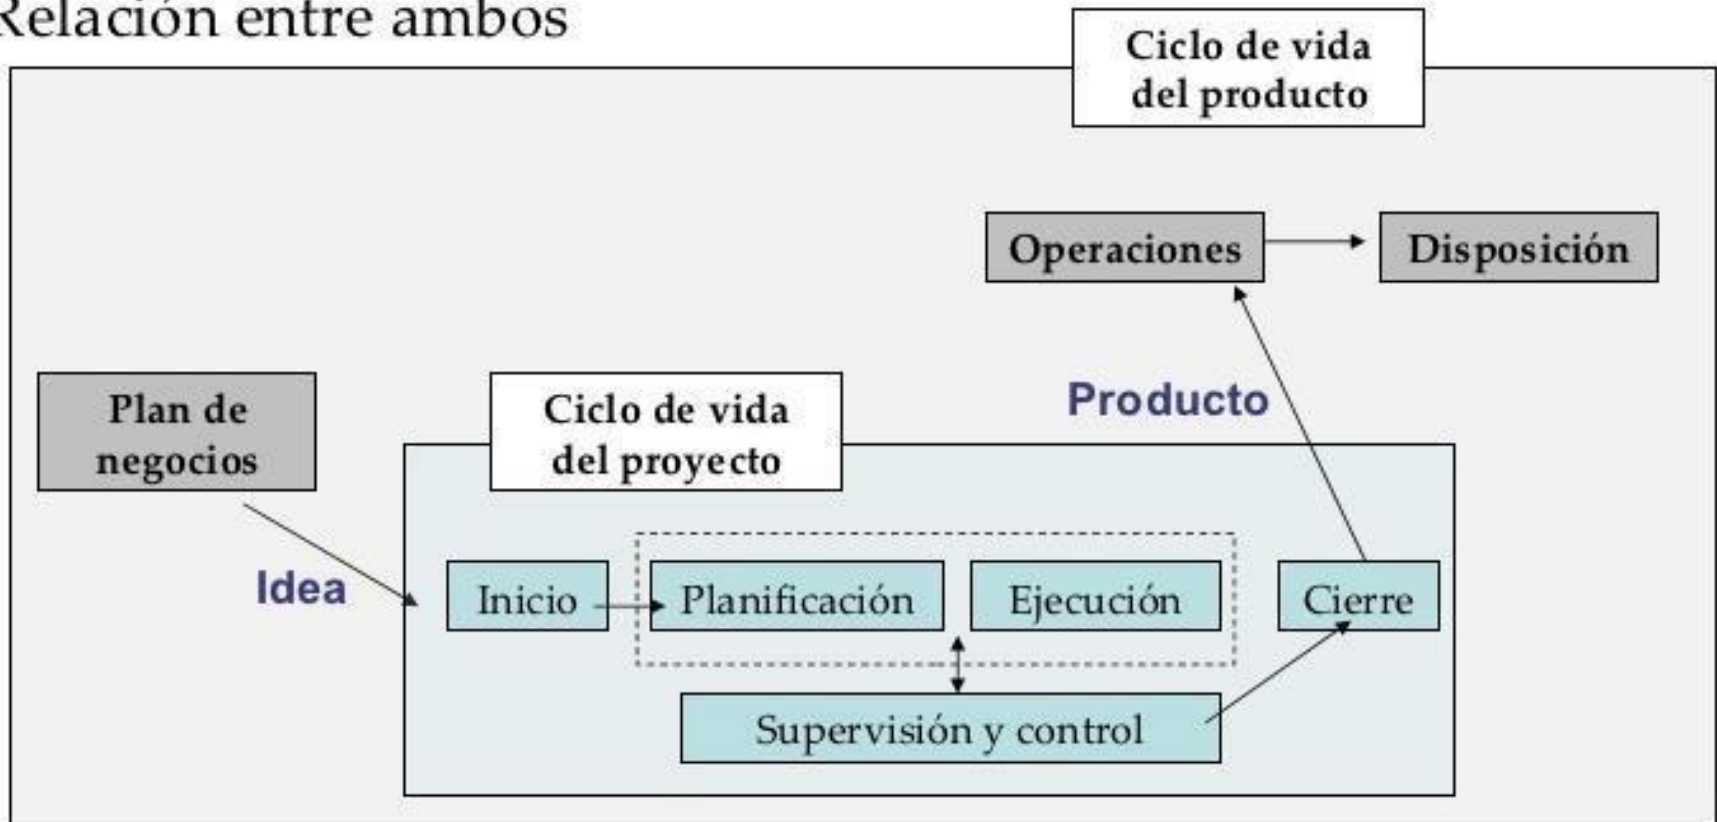

Ciclo de vida del proyecto




Tipos de Organización de Proyectos



	Descripción	¿Quién esta a cargo?	Ventajas	Desventajas
Funcional	Organización donde los miembros del equipo trabajan para un departamento y pueden ser prestados a un proyecto de vez en cuando	Gerente Funcional	• Mayor habilidad funcional • Más alto grado de especialización • Líneas de carrera mejor definidas	• El Gerente de proyecto no tiene gran poder • Los proyectos tienen baja prioridad (burocracia) • Los recursos frecuentemente no son otorgados
Proyectizada	La organización esta estructurada de acuerdo a proyectos y no a departamentos	Gerente de Proyecto	• El gerente de proyecto tiene gran autoridad • La comunicación en el proyecto es fluida (un sólo equipo) • Lealtad al proyecto es fuerte	• "No home" para los miembros del equipo • Crecimiento y desarrollo puede ser más difícil.
Mixta o Matricial	Organización híbrida donde los individuos reportan a un Gerente de Proyecto y a un Gerente Funcional	Poder balanceado entre ambos gerentes	Puede tener lo mejor de ambos	• Duplicación de esfuerzo en algunas tareas • Mayor conflicto • Menos lealtad

Fuente: <https://formulaproyectosurbanospmipe.wordpress.com/2012/03/27/influencias-de-la-organizacion-en-la-direccion-de-proyectos-la-guia-del-pmbok-capitulo-2-sesion-7-19-03-2012-segunda-parte/>

Estructura funcional

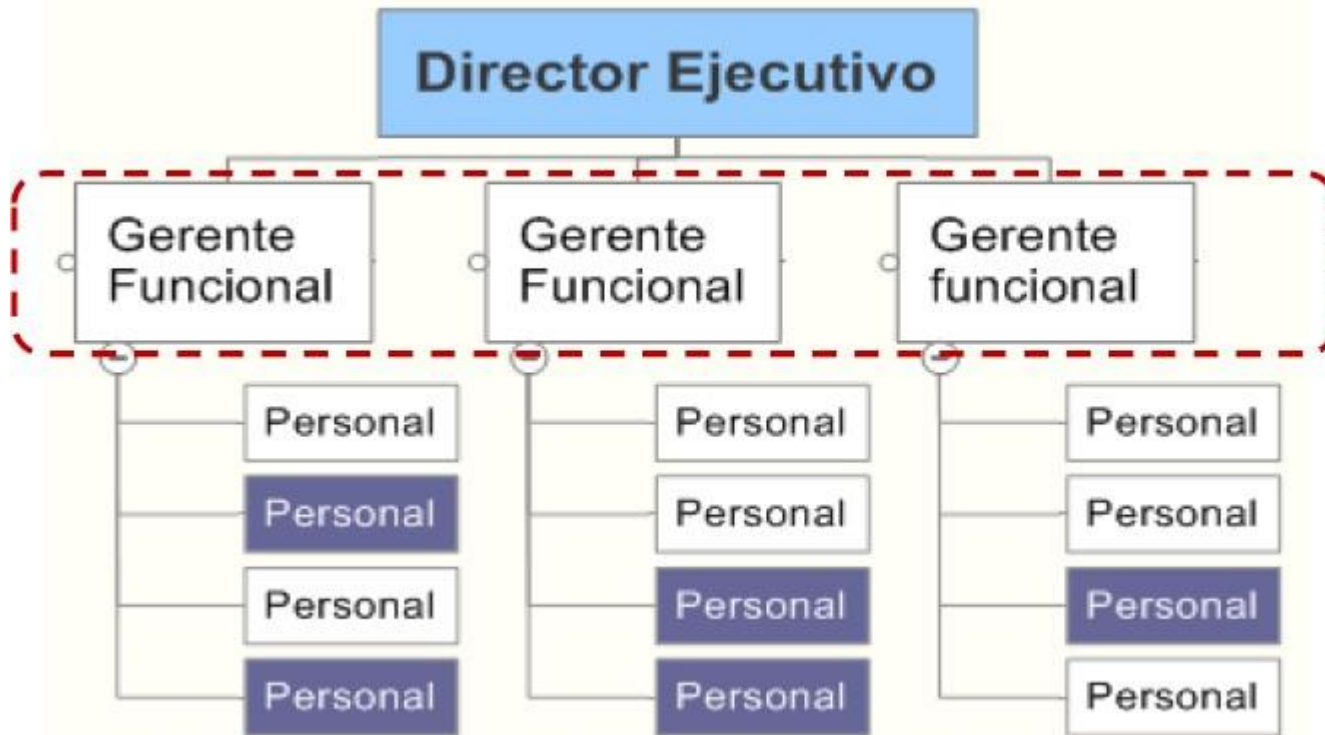

**Coordinación
del proyecto**

Estructura funcional




Ventajas	Desventajas
Sencilla gestión de especialistas.	El personal pone más interés en su perfil funcional que en su rol dentro del proyecto.
Los miembros del equipo sólo informan a un supervisor.	No hay definido un plan de carrera en gestión de proyectos.
Los recursos similares están centralizados.	El Project Manager tiene poca o ninguna autoridad.
Están claramente definidos los planes de carrera en cada área.	

Estructura Orientada a Proyectos



Coordinación
del proyecto

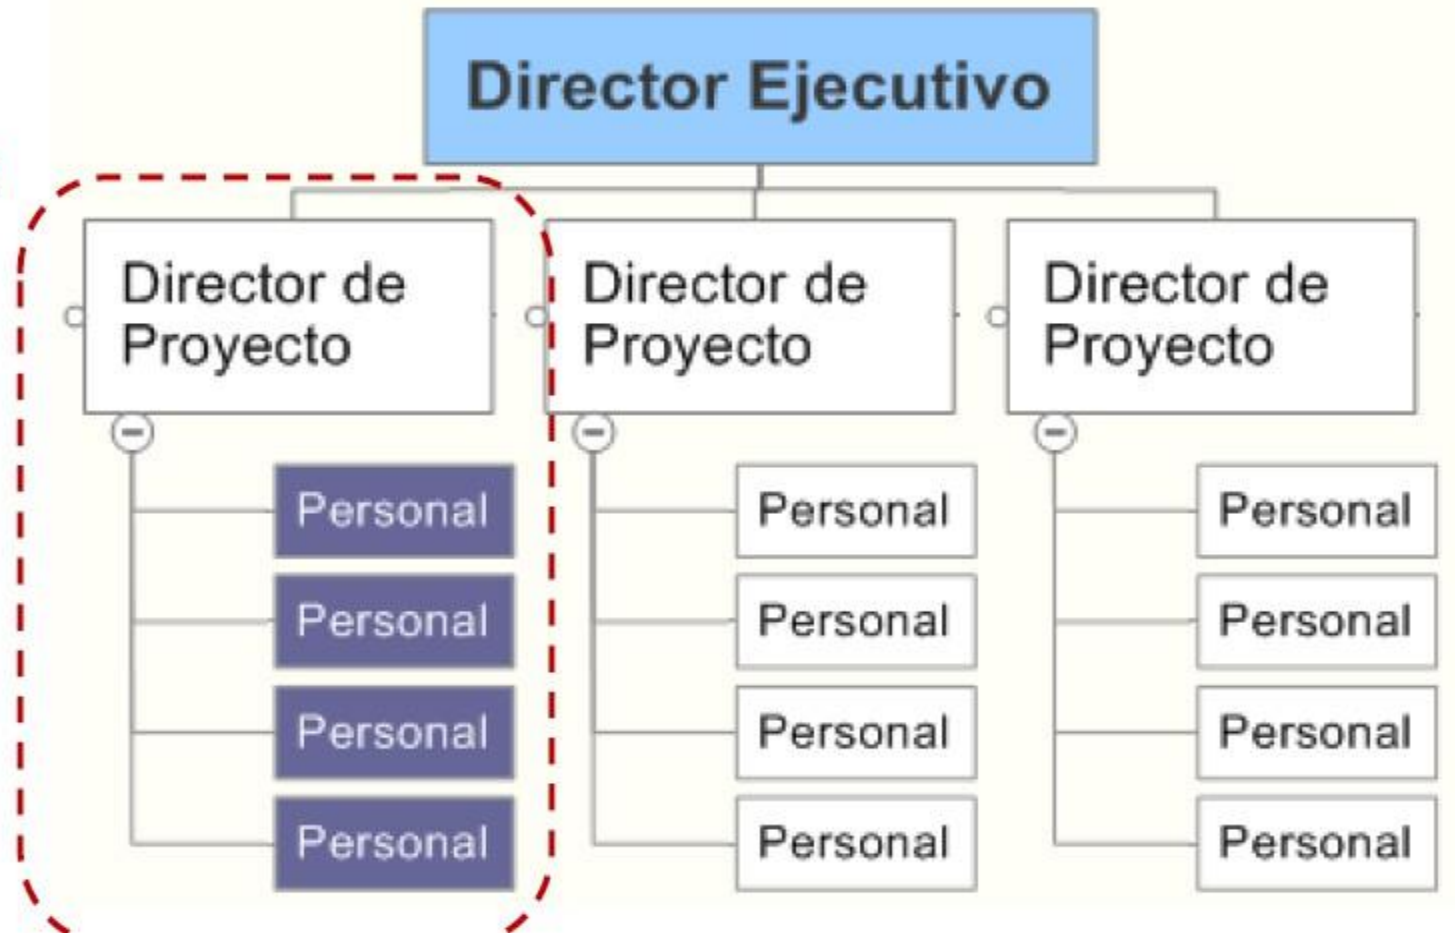

Estructura Orientada a Proyectos



Ventajas	Desventajas
Gestión de proyectos muy eficiente.	Cuando finaliza el proyecto, no hay “casa” para los miembros del equipo.
Lealtad o dedicación máxima al proyecto.	Falta de especialización en disciplinas específicas.
Comunicación mucho más efectiva que la estructura funcional.	Menor eficiencia en el uso de recursos.
Máxima autoridad del Project Manager.	


Estructura Matricial



Ventajas	Desventajas
Elevada visibilidad de los objetivos del proyecto.	Requiere mayor carga administrativa.
Mejor control del Project manager sobre los recursos del proyecto.	El equipo tiene más de un “jefe”.
Empleo máximo de recursos escasos.	Más complejas a la hora de hacer el seguimiento y control.
Los miembros del equipo de proyecto tienen “casa” cuando finaliza el proyecto.	Los gerentes funcionales puede tener diferentes prioridades que el Project manager.
	Elevada probabilidad para que surjan conflictos.




Estructura Matricial débil

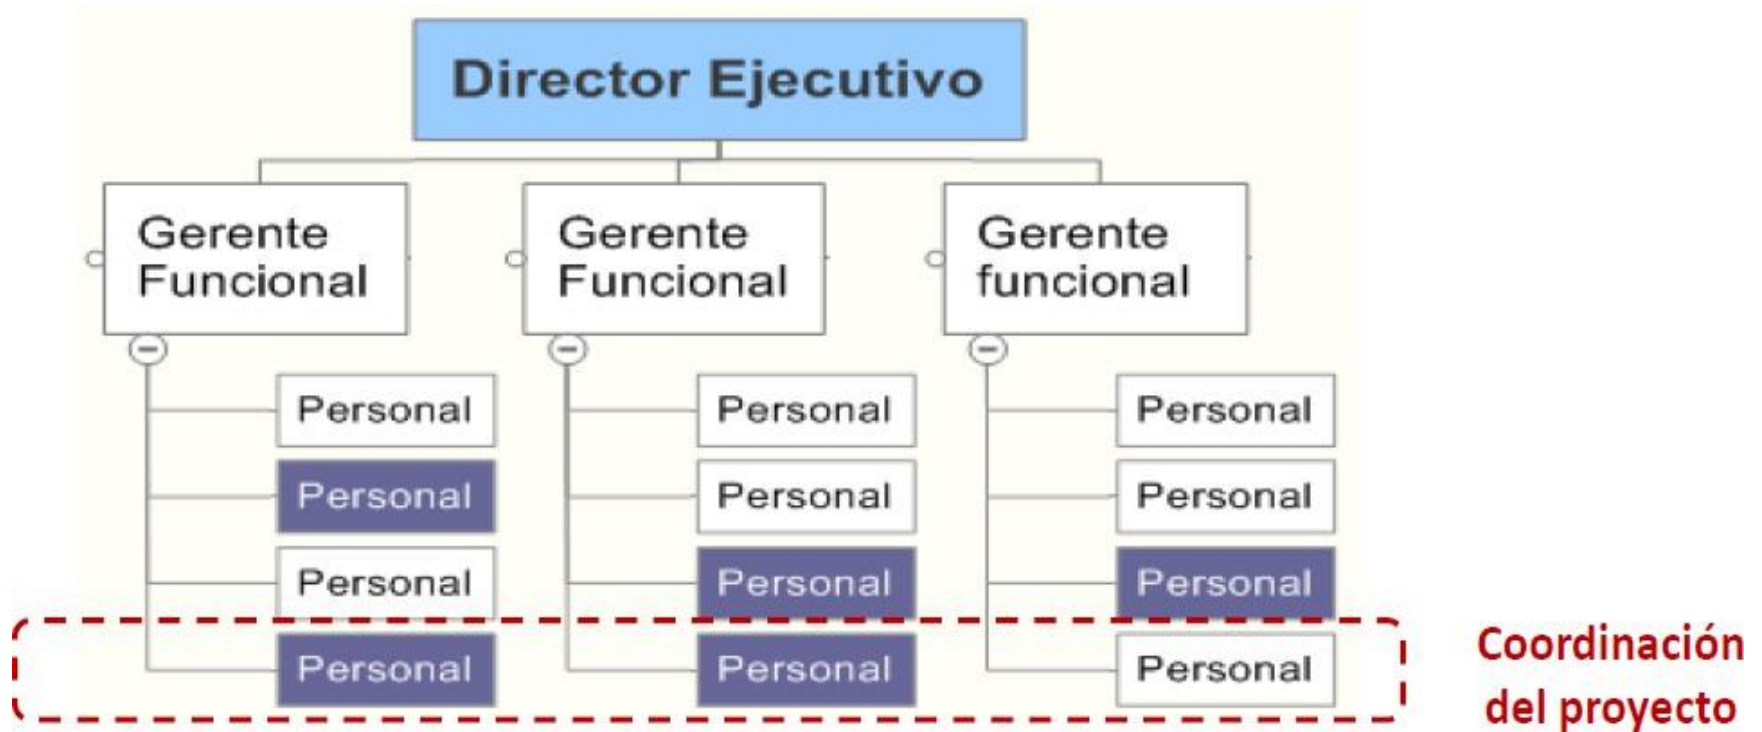




Estructura Matricial balanceada

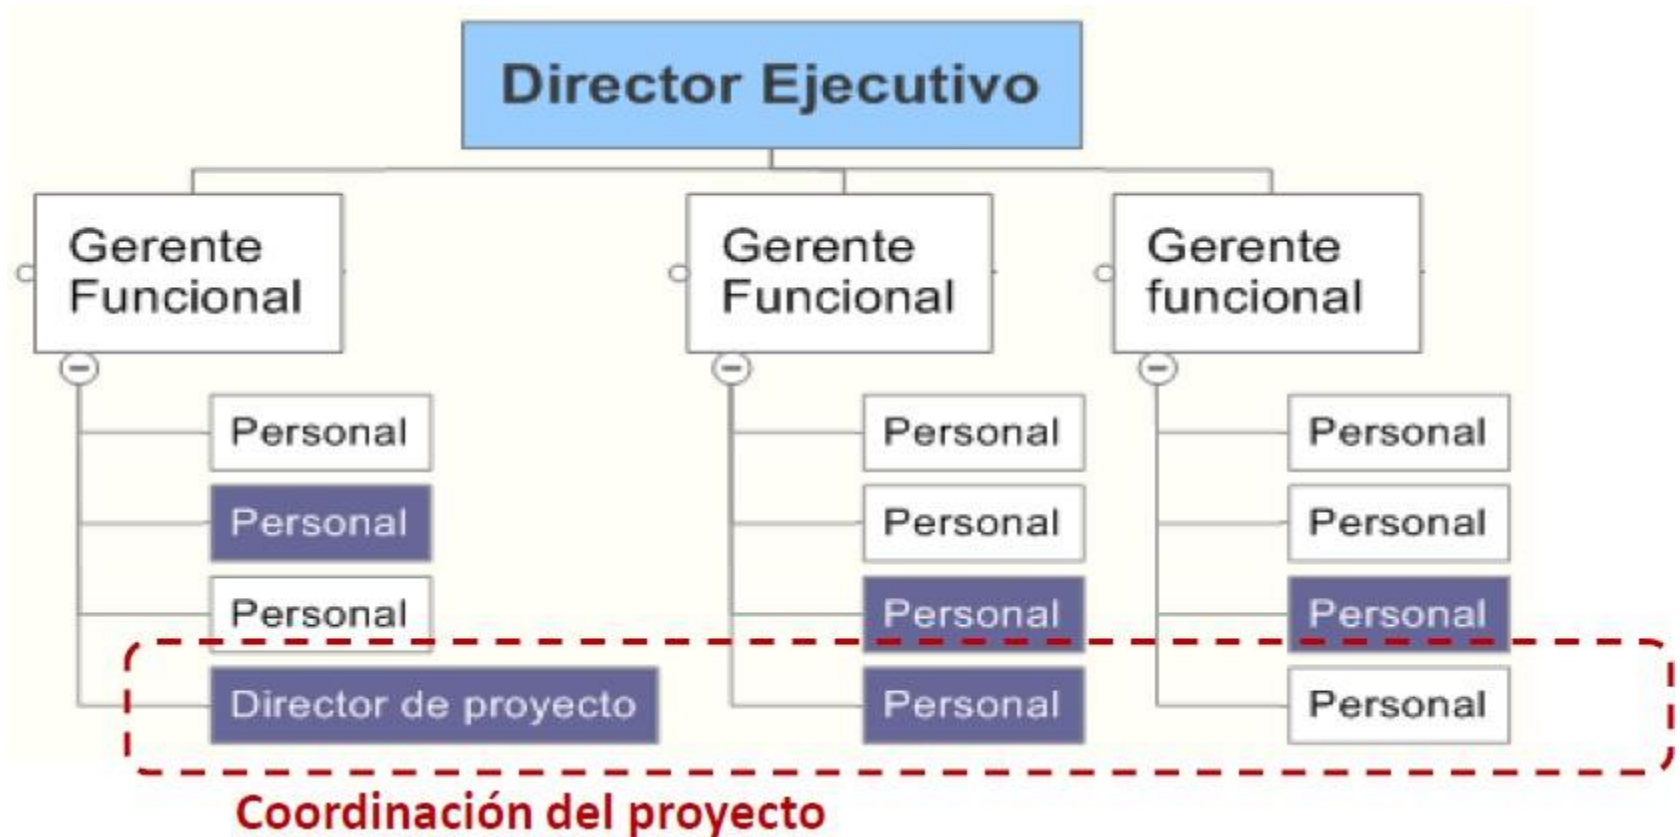



Estructura Matricial fuerte

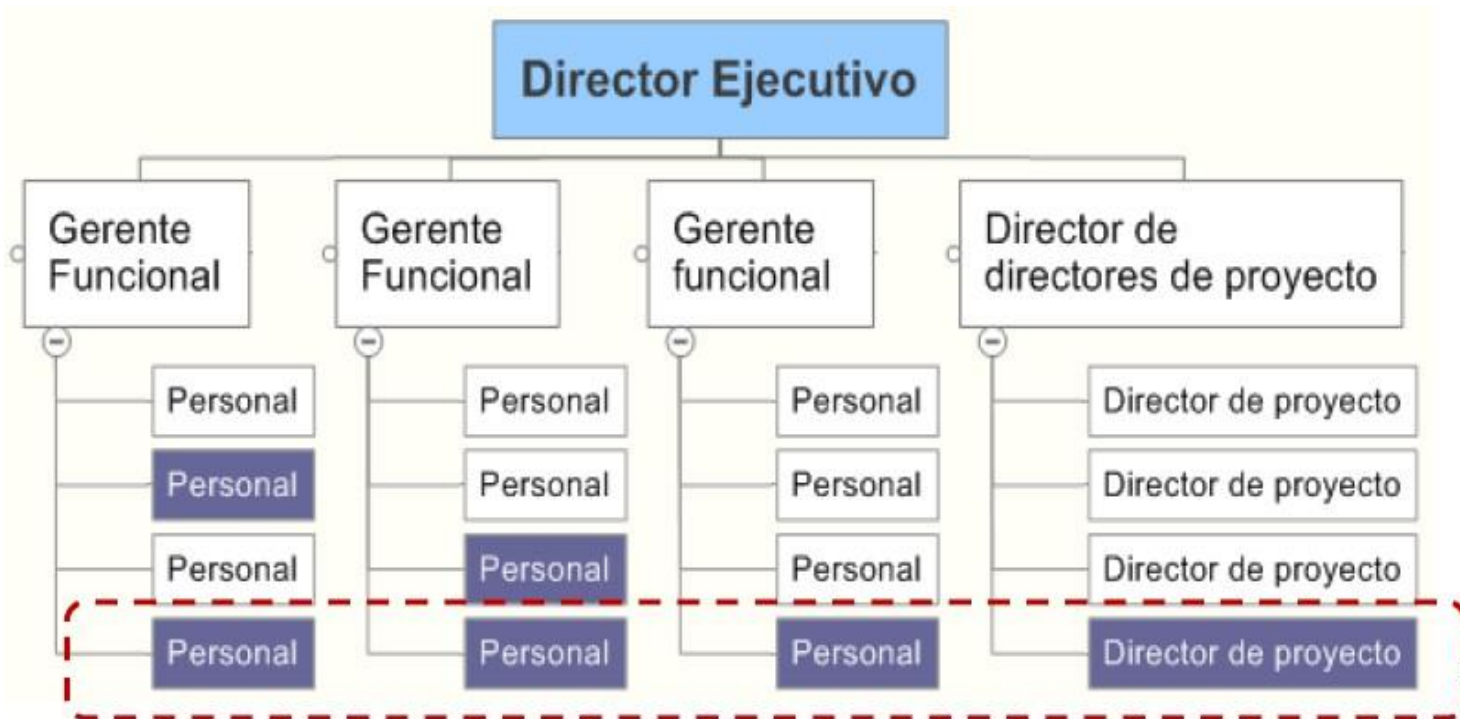

**Coordinación
del proyecto**



Activos de la organización y factores ambientales



Activos de los proceso de la organización

Procesos y procedimientos

- Procesos estandarizados,
- Plantillas,
- Guías...

Base de conocimiento corporativo

- Lecciones aprendidas,
- Resultados de las mediciones de los procesos,
- Líneas base...



Factores ambientales de la empresa

Elementos tangibles e intangibles, tanto internos como externos, que no están bajo el control del equipo de proyecto y que influyen, **restringen** o dirigen **de manera positiva o negativa el proyecto**.

- Cultura de la organización,
- Normativa gubernamental,
- Infraestructura,
- Condiciones del mercado,
- Clima político



Introducción a la Gestión de Proyectos de Software - Gestión Ágil


Fundamentos Agile



Definiendo Agile

Agile es una manera diferente de hacer las cosas basada en la iteración y el incremento.

- **Trabajo Colaborativo:** Mayor vinculación de negocio y usuarios para trabajar conjuntamente eliminando problemas de comunicación
- **Mejora Continua:** Revisión continua de avances, cuestionamiento continuado de estrategias, herramientas objetivos
- **Optimiza inversiones:** Reducir desperdicios, eliminar características innecesarias de los productos, aumentar la productividad y velocidad de equipos.
- Continua revisión de los avances permite maniobrar y adaptarse a cambios

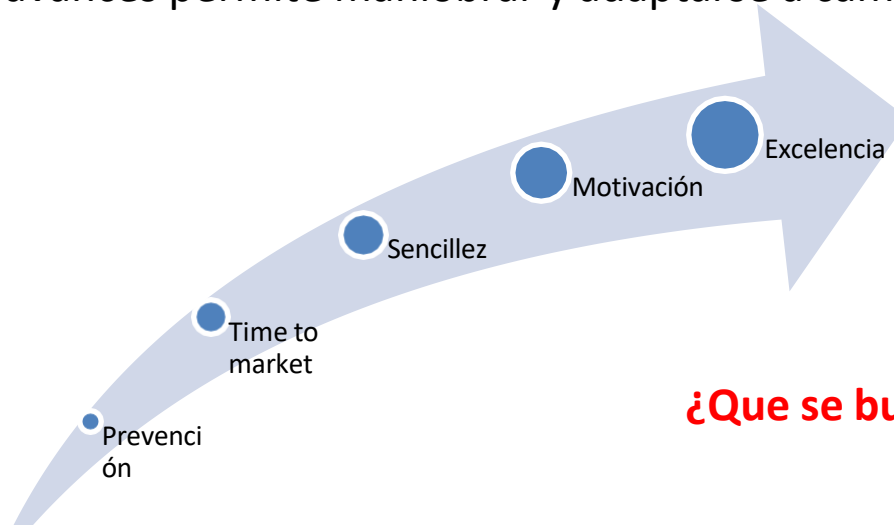


¿Que se busca con agile?

Gestión Ágil de Proyectos



- Ágil no es una metodología, sino un enfoque.
- Usa Modelos basados en las personas, la colaboración y valores compartidos.
- Representan el presente y el futuro.
- Es la única forma posible de adaptarse al dinamismo que envuelve el ámbito empresarial hoy día.
- Alternativa más beneficiosa, no sólo para la propia organización sino también para el cliente.
- Retorno de Inversión temprana
- Adaptación a necesidades cambiantes de negocio.
- Visibilidad del Proyecto
- Adaptabilidad
- Valor del Negocio
- Reducción de Riesgos

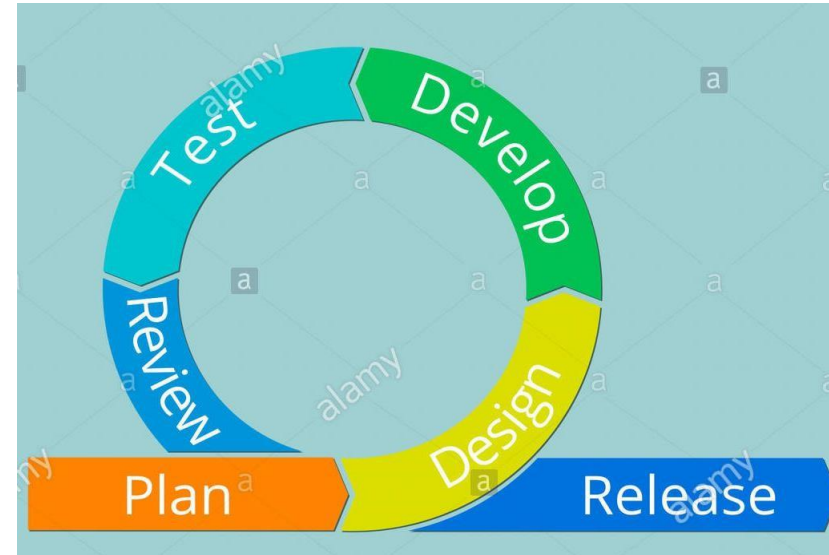

Manifiesto Ágil



Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.



Metodologías Ágiles



Conclusiones



- ¿Qué es un proyecto, programa, portafolio?
- ¿Qué es la PMO?
- ¿Cuáles son los procesos de la gestión de proyectos?
- ¿Cuáles son las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos?
- ¿Cuáles son los tipos de organización de proyectos?
- ¿Cuáles son los valores del Manifiesto Ágil?
